

車両系荷役運搬機械等 作業計画

打合せ内容確認		
所長	元方管理者	職長及び運転者等

計画作成月日	平成22年10月1日(金曜日)
計画打合せ日	平成22年10月4日(日曜日)


工事名	林道改修・拡幅工事		
作業内容	切土運搬・搬出作業 ~搬出量 500m ³	作業期間	自平成22年10月5日 至平成22年10月20日
作成者	会社名 山森建設工業(株)	職氏名	職長 若水 仁
機械名称・性能	メーカー・型式 H94 CG65	メーカー・型式 本田 MST1500	
	最大積載量 6.0t 全長5.06m 全幅2.64m	最大積載量 6.0t 全長5.3m 全幅2.64m	
定期自主検査	自主検査有効期限	平成22年5月15日	自主検査有効期限
	直近の月例検査	平成22年9月6日	直近の月例検査
運転者	不整地運搬車 運転技能講習修了者	氏名 村山 健	不整地運搬車 運転技能講習修了者
		氏名 水尻 浩一	
作業時間	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17		
作業指揮者	氏名 長沢 仁	所属会社名	山森建設工業(株)

運搬	積荷の状況	種類 土砂	形状 平積
	作業方法	積込 バックホウ	荷卸 ダンプトラック
積卸	誘導者(合図者)	積込 積込員 武田 英雄	積卸 積込員 伊藤 孝夫
	障害物等	切土運搬ダンプトラック	
搬	運搬距離	片道 800m	幅員 最大 6.5m 最小 5.5m
	路面状況	林道	最大傾斜 最大5度
作	運行方法	一方通行・交互通行(優先方向など 下り運搬車を優先する)	
	誘導者配置	有・無 氏名	高さ制限 無し
業	待避場設置	有・無 1ヶ所(荷卸場から300m付近) 方向転換(積込場から60m付近)	
	転落危険	危険箇所(有)・無 危険箇所の状況(路肩から落下高さ7m)	
計	接触危険	危険箇所(有)・無 接触する人・物・箇所(オペ(バックホウ)・作業員・誘導員)	
	制限速度	作業場所等の地形・傾斜・地盤に応じた適正な速度 制限速度表示(有)(2箇所)・無	

安全指示事項	<ul style="list-style-type: none"> 運搬作業中は、作業員(指揮者含む)等の通行路通行を禁止する。~「運搬作業中」「進入禁止」等の標示 接近限界標示は、路肩から1.5m以上離れた位置に設置し、危険標示とする。 積込場所では、~方向転換後、誘導員の指示に従って、後進し若降す。~傾斜地では、荷役中はハドルキ、エンジン停止 荷卸場所は、搬出ダンプの接触防止の意、誘導員指示を厳守(入場時は先車優先)
--------	---

作業区域と運行経路 (計画打合せ時に記載内容をチェックする。)

- 運行経路と走行方向 ・地形(幅員・地盤など) ・速度制限 ・誘導者 ・合図者位置
- 退避場の位置 ・転落危険箇所 ・接触危険箇所 ・交差点位

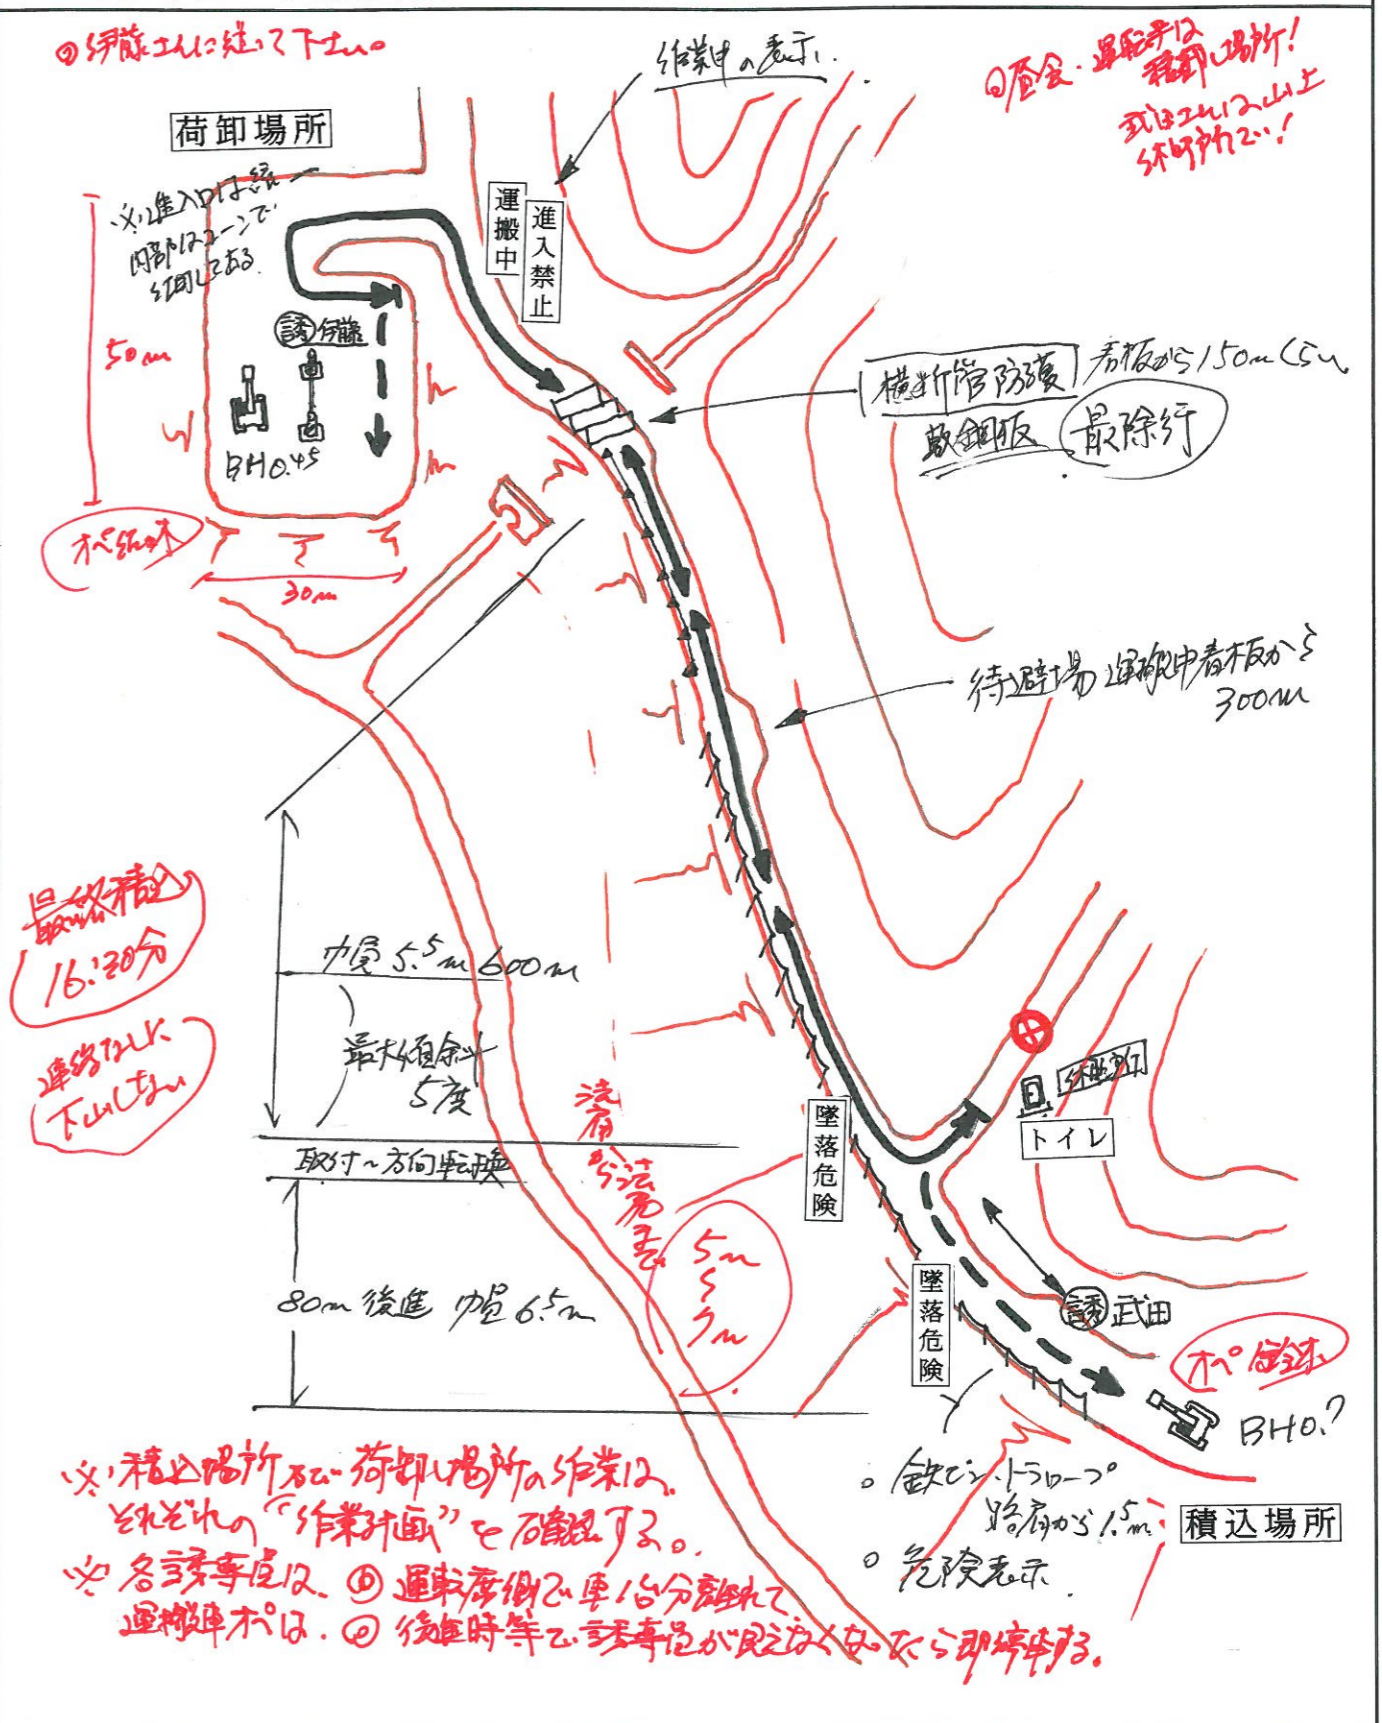

計画内容周知の記録	平成22年10月5日 AM・PM 7:30
確認サイン	長沢 仁 村山 健 水尻 浩一 武田 英雄 伊藤 孝夫
